

Provincia di
REGGIO EMILIA

Regione
EMILIA ROMAGNA

Comune di
CADELBOSCO DI SOPRA



Oggetto:

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

**LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UNA PAVIMENTAZIONE IN
BATTUTO DI CEMENTO E LAVORI DI ASFALTATURA DI
VIABILITA' INTERNA DI SERVIZIO
PRESSO SEDE SABAR SpA, NOVELLARA (RE)**

CRONOPROGRAMMA

Progettazione:



Studio T.En.

Studio Associato di Ingegneria

Via A. Einstein, 11 - 42122 Reggio Emilia

Tel 0522 337096 - Fax 0522 337592

E-mail: info@studioten.it

ing. Stefano Teneggi

Tav. n°:

n°:

Revisione:

Data:


Data:

MAGGIO 2017

Scala:

Collaboratori:

N. ord.	Attività	Inizio	Fine	Durata
AMPLIAMENTO DEL PIAZZALE ESISTENTE ED ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO				
OPERE PRELIMINARI ED ACCANTIERAMENTO				
1	Allestimento cantiere	18/09/2017	23/09/2017	5
2	Rilievo generale dell'area e verifica in contraddittorio con la D.LL. dello stato dei luoghi (planimetrico ed altimetrico) in funzione delle opere da realizzare	20/09/2017	27/09/2017	7
3	Tracciamento e materializzazione dei capisaldi di riferimento e dei punti utili alla successiva costruzione	27/09/2017	29/09/2017	2
MOVIMENTI TERRA E PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA PAVIMENTAZIONE				
4	Scotico superficiale dell'area interessata dalla costruzione dell'ampliamento del piazzale	29/09/2017	02/10/2017	3
5	Scavi per riqualificazione di aree a modesta portanza e ricostruzione dello strato con materiale di qualità adeguatamente compattato	02/10/2017	09/10/2017	7
6	Sagomatura con misto stabilizzato nel rispetto delle quote approvate dalla D.LL.	09/10/2017	14/10/2017	5
7	Pulizia della parete perimetrale della pavimentazione attuale	29/09/2017	02/10/2017	3
1 8	Esecuzione di prefori per il successivo inserimento di barrotti di connessione tra la pavimentazione esistente e quella di nuova costruzione	02/10/2017	12/10/2017	10
REALIZZAZIONE PIAZZALE IN BATTUTO DI CEMENTO				
9	Carpenteria per formazione delle cassature perimetrale del la pavimentazione	15/10/2017	20/10/2017	5
10	Fornitura e posa di barrotti di connessione tra pavimentazione esistente e di nuova costruzione	19/10/2017	29/10/2017	10
11	Fornitura e posa di armatura in acciaio	19/10/2017	29/10/2017	10
12	Esecuzione di pavimentazione in getto di calcestruzzo fibrorinforzato completo di giunti strutturali	22/10/2017	01/11/2017	10
13	Esecuzione ed intasamento di giunti di dilatazione ed intasamento di giunti strutturali	03/11/2017	06/11/2017	3
14	Raccordo con misto stabilizzato e getto di calcestruzzo tra nuova pavimentazione e fosso perimetrale	16/11/2017	23/11/2017	7
PAVIMENTAZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO				
15	Pulizia della viabilità attuale e sagomatura delle cunette laterali	04/11/2017	08/11/2017	4
16	Sistema di regolazione dei flussi veicolari	04/11/2017	06/11/2017	2
17	Sagomatura del piano stradale e delle banchine con misto stabilizzato	08/11/2017	12/11/2017	4
18	Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso	12/11/2017	16/11/2017	4
19	Apposizione di segnaletica stradale orizzontale e verticale	20/11/2017	27/11/2017	7
SMOBILITAZIONE CANTIERE				
20	Collaudi e verifiche e restituzione as built delle opere realizzate	23/11/2017	14/12/2017	21
21	Smolizione cantiere	07/12/2017	17/12/2017	10

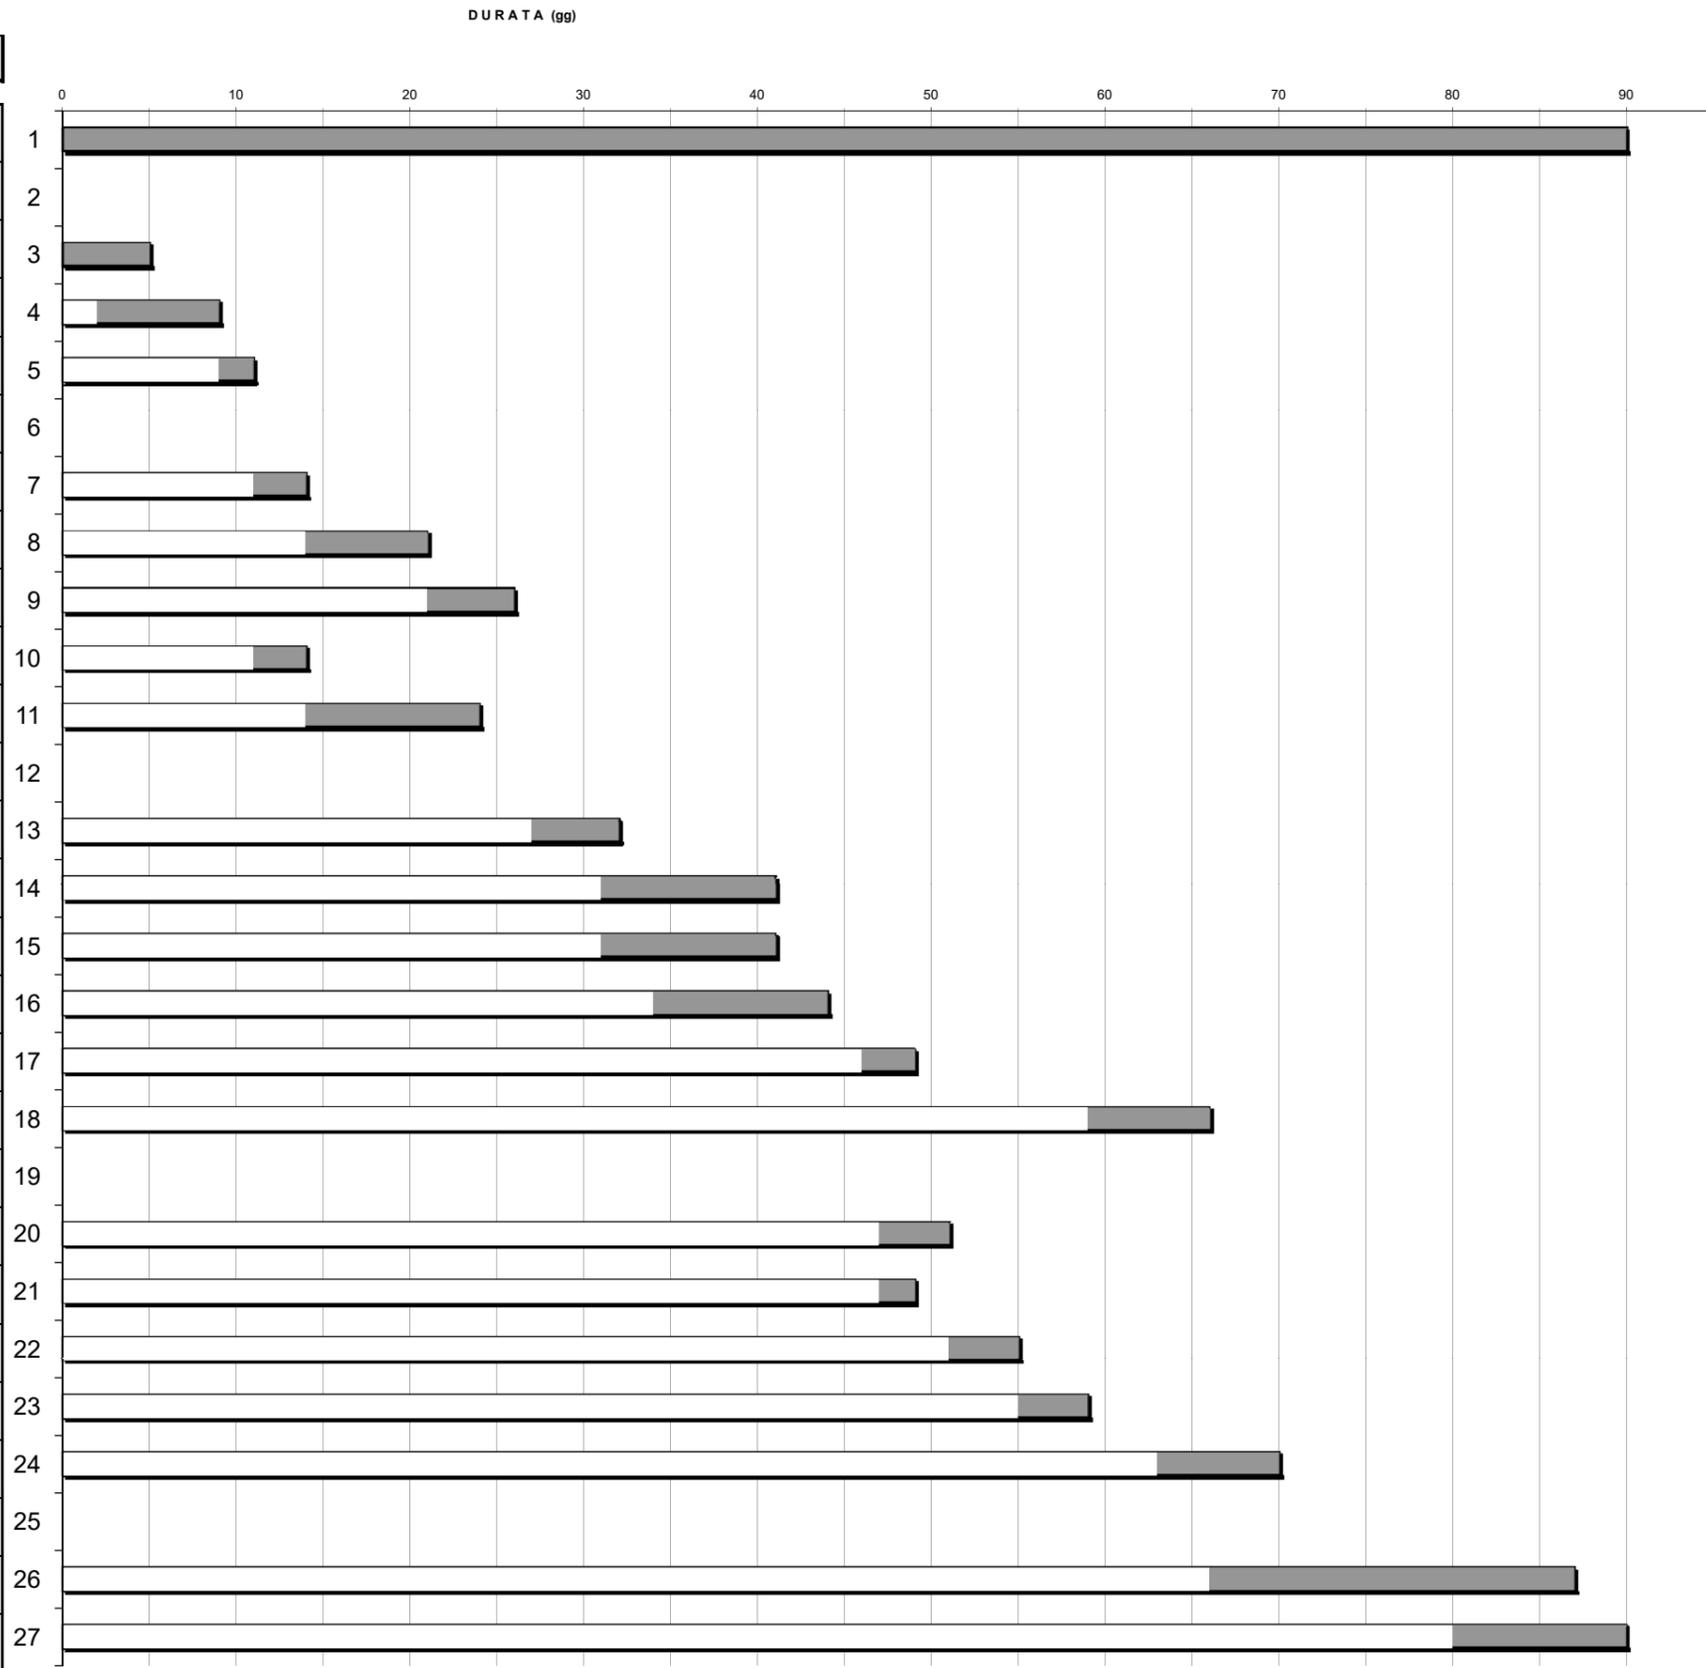

Inizio dei lavori
18 settembre 2017 gg

Fine lavori
17 dicembre 2017 gg
