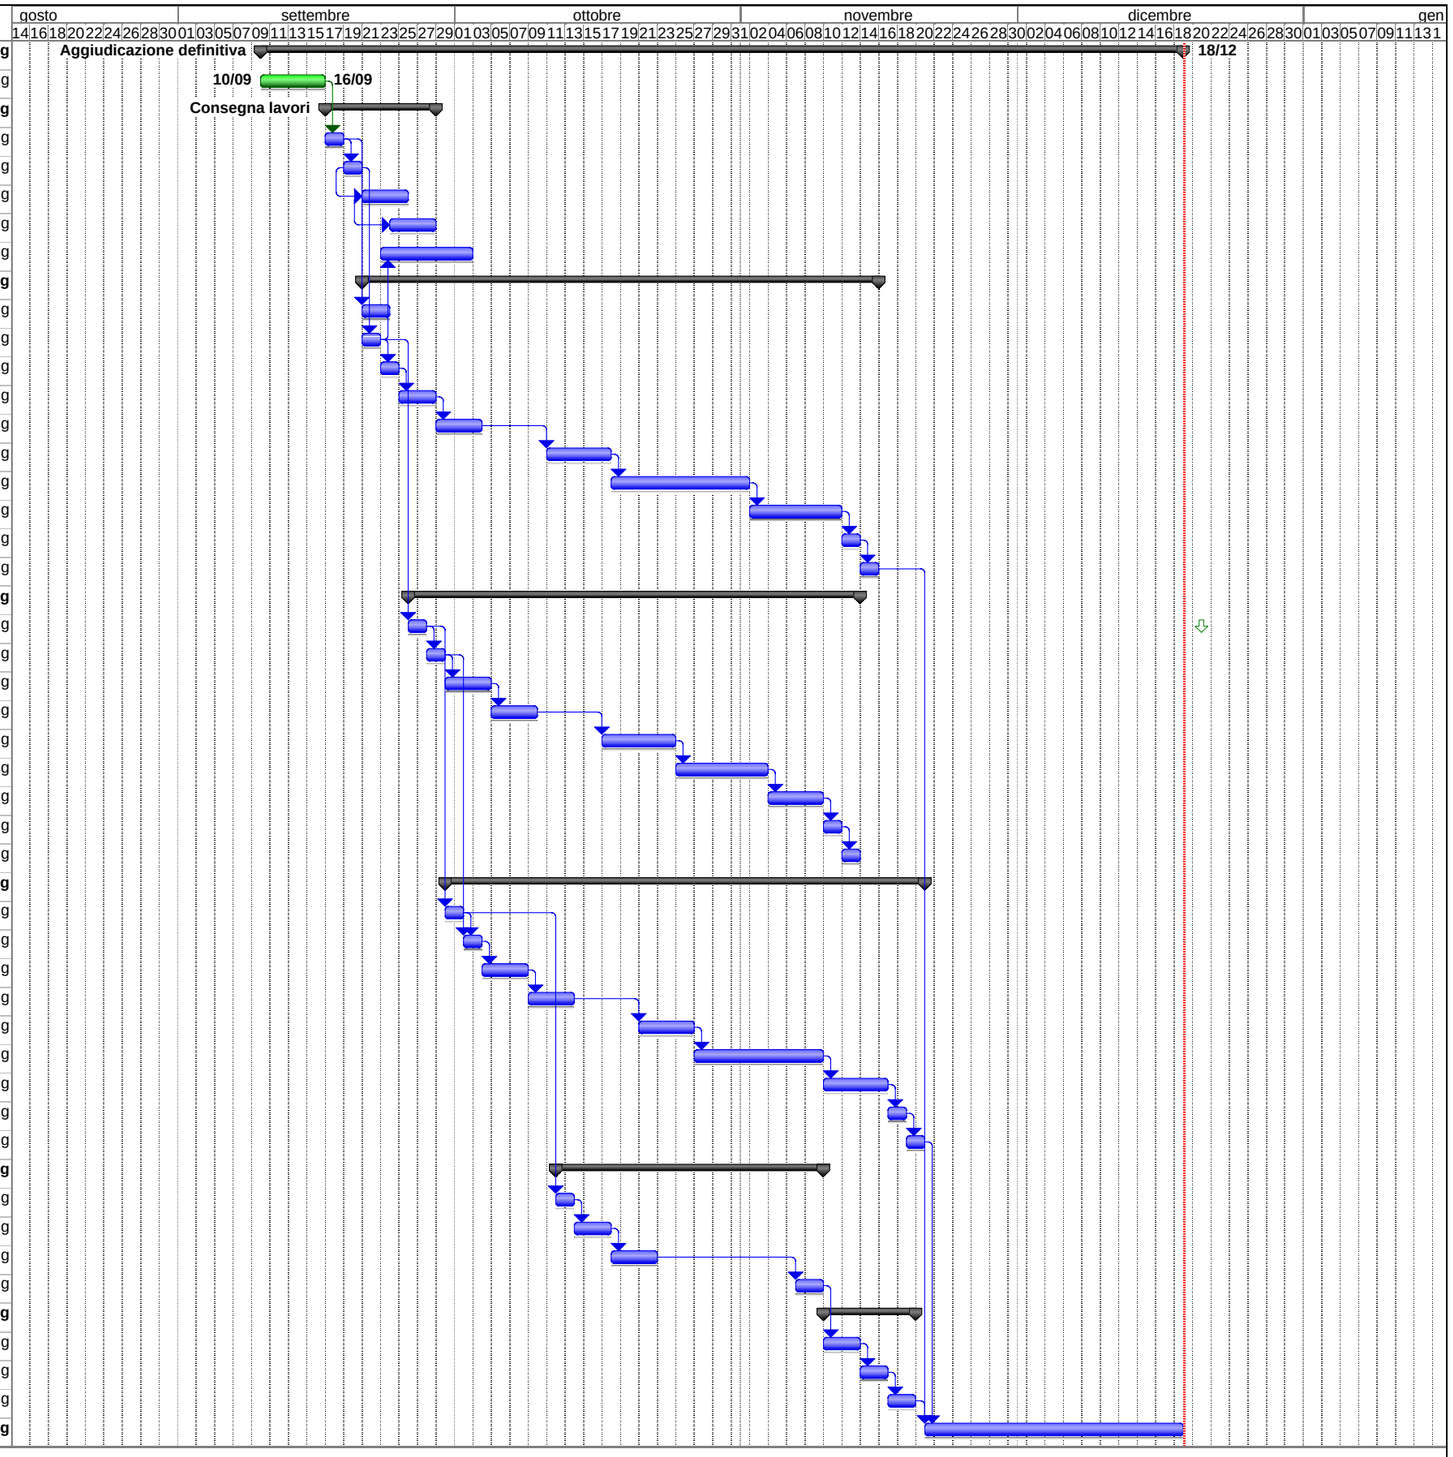ID	Nome attività	Durata
1	**OPERE OGGETTO D'APPALTO**	**100 g**
2	**PROGETTAZIONE ESECUTIVA**	7 g
3	**RETI INFRASTRUTTURALI**	**12 g**
4	TAGLIO MASSICCIATA STRADALE BITUMATA	2 g
5	SCAVI	2 g
6	FORNITURA E POSA DI TUBI E MANUFATTI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI INFRASTRUTTURALI	5 g
7	RINTERRI PER OPERE A RETE	5 g
8	**OPERE DI ADEGUAMENTO DELLE RETI ELETTRICHE E INFRASTRUTTURALI ESISTENTI**	10 g
9	**NUOVA STAZIONE DI ASPIRAZIONE**	**56 g**
10	TAGLIO MASSICCIATA STRADALE BITUMATA	3 g
11	SCAVI	2 g
12	FORNITURA E POSA DI CASSEFORMI	2 g
13	ARMATURE	4 g
14	GETTO DEL CALCESTRUZZO	5 g
15	MONTAGGIO CARPENTERIA	7 g
16	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TUTTA L'IMPIANTISTICA	15 g
17	COLLEGAMENTI ELETTRICI PNEUMATICI ED IDRAULICI	10 g
18	OPERE DI FINITURA	2 g
19	COLLEGAMENTI E VERIFICHE	2 g
20	**NUOVA SOTTOSTAZIONE DI ASPIRAZIONE**	**49 g**
21	SCAVI	2 g
22	FORNITURA E POSA DI CASSEFORMI	2 g
23	ARMATURE	5 g
24	GETTO DEL CALCESTRUZZO	5 g
25	MONTAGGIO CARPENTERIA	8 g
26	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TUTTA L'IMPIANTISTICA	10 g
27	COLLEGAMENTI ELETTRICI PNEUMATICI ED IDRAULICI	6 g
28	OPERE DI FINITURA	2 g
29	COLLEGAMENTI E VERIFICHE	2 g
30	**NUOVA CABINA UTENZA**	**52 g**
31	SCAVI	2 g
32	FORNITURA E POSA DI CASSEFORMI	2 g
33	ARMATURE	5 g
34	GETTO DI CALCESTRUZZO	5 g
35	MONTAGGIO CABINA PREFABBRICATA	6 g
36	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TUTTA L'IMPIANTISTICA	14 g
37	COLLEGAMENTI ELETTRICI PNEUMATICI ED IDRAULICI	7 g
38	OPERE DI FINITURA	2 g
39	COLLEGAMENTI E VERIFICHE	2 g
40	**PROLUNGAMENTO BATTUTO ESISTENTE**	**29 g**
41	SAGOMATURA TERRENO	2 g
42	ARMATURE	4 g
43	GETTO DEL CALCESTRUZZO	5 g
44	RIPRISTINI STRADALI	3 g
45	**INSTALLAZIONE SERBATOI MOTORI**	**10 g**
46	OPERE PER IL COLLEGAMENTO TRA DEPOSITO E SERBATOI	4 g
47	INSTALLAZIONE SERBATOI	3 g
48	COLLEGAMENTI E VERIFICHE	3 g
49	**COLLAUDI, VERIFICHE GLOBALI**	**28 g**
